

厚 生 常 任 委 員 会

資 料

令和 3 年 6 月 2 4 日（木）

病 院 局

目 次

【報告事項】

令和２年度宮崎県立病院事業会計予算繰越計算書 … 別冊

【その他報告事項】

新県立宮崎病院の開院及び全体整備スケジュール等の
見直しについて … １頁

【その他報告事項】

新県立宮崎病院の開院及び全体整備スケジュール等の見直しについて

経営管理課 県立病院整備推進室

1 新県立宮崎病院の開院

新県立宮崎病院は、令和3年9月末完成の後、医療機器等の搬入や電子カルテシステムの移行作業などの開院準備等を進め、令和4年1月11日（火）に開院し、外来診療等を開始する。

2 全体整備スケジュールの見直し


(1) 概要

新病院開院（令和4年1月）後の解体工事に日時を要することとなったため、全体の整備完了（グランドオープン）時期を令和5年4月から6ヶ月程度延期する。

(2) 延期の理由

解体工事において、アスベスト処分に関する取扱いが変更され、アスベスト含有が確認された内外装仕上塗材は、特定の分別除去作業が必要となったことから、解体工事に要する工期が1年から1年6ヶ月程度に延びるため。

(3) 整備スケジュール

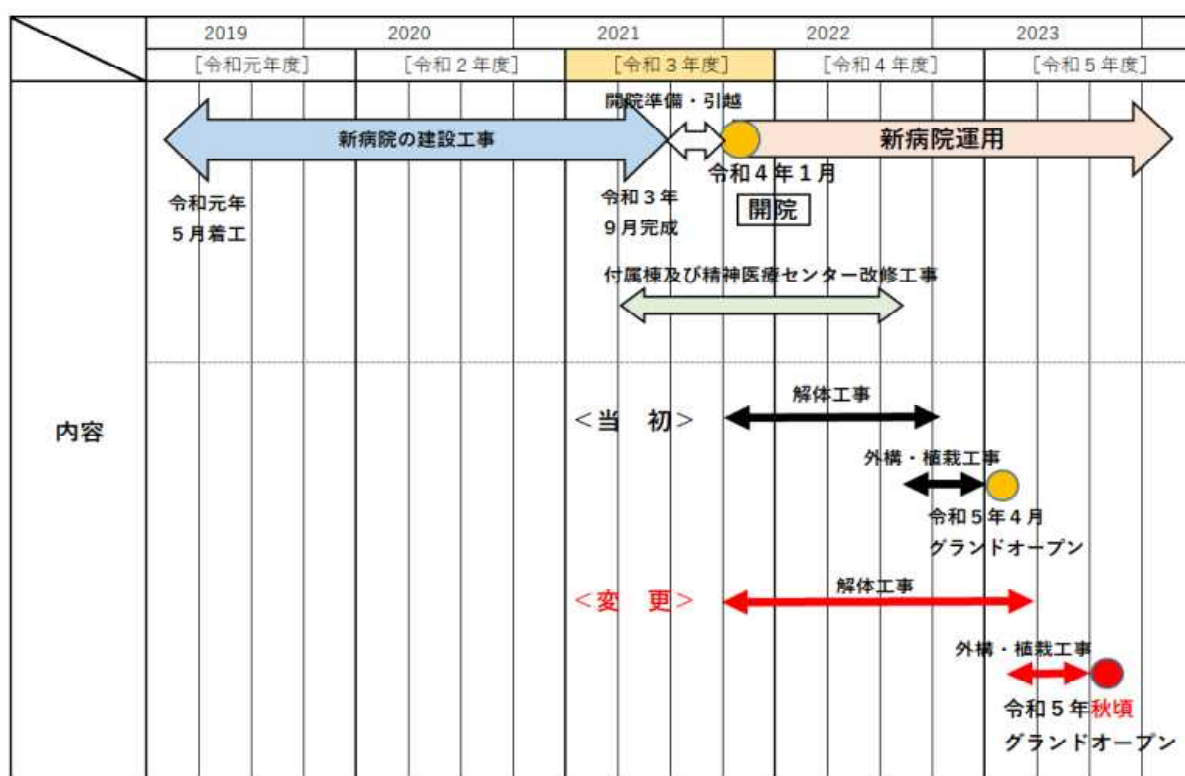

3 再整備事業全体の事業費見込み

- ・ 本体工事等については、資材や労務単価の変動（インフレスライド）に伴う増額や新型コロナウイルスの感染急増時の対応に伴う施設整備の追加、療養環境の向上に伴う変更など、10.4億円から12.4億円程度の増額の見込みである。
- ・ 付帯工事等については、解体工事において、アスベスト処分の特定分別除去作業に伴う増額や労務単価の上昇により、10.5億円から12.5億円程度の増額の見込みである。
- ・ 上記により工事関連事業費では20.9億円から24.9億円程度の増額となるが、医療機器整備費について、5億円程度の圧縮に努めることにしており、基本設計完了時の事業費からの縮減目標額50億円に対し、35.0億円から31.0億円程度の縮減となる。

(1) 本体工事等

約10.4～12.4億円の増額

- ① インフレスライド (約5.2億円)
 - ・ 資材や労務単価の増加に伴う変更
- ② 新型コロナ対応、安全・防火等対策強化 (約1.0億円)
 - ・ 感染急増時の対応のための新たな施設整備の追加に伴う変更
 - ・ 耐震天井、耐火被覆の追加 等
- ③ 診療等機能向上 (3.0～5.0億円)
 - ・ 診療関連諸室のレイアウト変更に伴う間仕切壁、設備機器等の追加
 - ・ OAフロアの増設 等
- ④ 療養環境向上他 (約1.2億円)
 - ・ ユニットシャワー、ユニットバス追加 等

(2) 付帯工事等

約10.5～12.5億円の増額

- ① 設計業務等
 - ・ 実施設計の落札残額及び電気引込手数料等の見込み (▲約1.0億円)
- ② 解体工事 (11.5～13.5億円)
 - ・ アスベスト除去
 - ・ 労務単価上昇 等

(3) 事業着手後の新たな経費

約14.8億円の増額

- ①インフレスライド (約5.2億円)
- ②新型コロナ対応等 (約1.0億円)
- ③アスベスト除去等 (約8.6億円)

(4) 予算の補正

- ・ 本体工事等及び付帯工事等に係る予算の増額補正を9月県議会定例会に上程する予定。

(当初の縮減目標に対する最終縮減見込み額)

(億円、税込)

	基本設計 完了時 H28.10 (A)	見込み (事業着手時) H31.3 (B)	増減 (B-A)
準備工事等 設計費 立体駐車場工事費 仮設・道路改築工事費	9.8	9.8	±0.0
本体工事等 設計費、工事監理、CM業務等 本体工事費 外構工事費	277.6	234.9	▲ 42.7
付帯工事等 設計費 改修工事費 解体工事費 負担金等	28.9	21.1	▲ 7.8
工事費	316.3	265.8	▲ 50.5

(億円、税込)

最大縮減見込み		最小縮減見込み		工事費 増減内訳
見込み (R3.5末時点) (C1)	増減 (C1-A)	見込み (R3.5末時点) (C2)	増減 (C2-A)	
9.8	±0.0	9.8	±0.0	
245.3	▲ 32.3	247.3	▲ 30.3	①インフラコスト +5.2 ②コロナ、安全防火 +1.0 ③診療機能向上 +3.0~5.0 ④療養環境向上他 +1.2
31.6	+ 2.7	33.6	+ 4.7	①設計業務等 ▲1.0 ②解体工事 +11.5~13.5 ※内アスベスト+労働単価 +8.6
286.7	▲ 29.6	290.7	▲ 25.6	+20.9~24.9
	[▲ 44.4]		[▲ 40.4]	

※()内は、赤字で示した増減経費を除いたもの

医療機器整備費	65.2	65.2	±0
その他費用(開院支援等)	8.5	8.5	±0
医療機器整備等	73.7	73.7	±0

60.0	▲ 5.2	60.0	▲ 5.2
8.5	±0	8.5	±0
68.5	▲ 5.2	68.5	▲ 5.2

総事業費	390.0	339.5	▲ 50.5
うち医療機器整備費を除く事業費	324.8	274.3	

355.2	▲ 34.8	359.2	▲ 30.8
295.2	[▲ 49.6]	299.2	[▲ 45.6]

※四捨五入の関係で内訳と合計が一致しないことがある。

※()内は、赤字で示した増減経費を除いたもの

(注)事業費は、今後の入札等により変動する。
