

# 単品スライド条項 運用マニュアル

## 受発注者向け 手順書

令和8年3月

## 適用の要件

### 単品スライド適用の必須条件

#### 1. 変動額の判定

品目毎の変動額が請負代金額の1%を超えていること。  
 (運用マニュアルP4 1-3-2)

(品目毎とは右の表の品目の赤枠ごとに分けること)

| 区分          | 品目          | 材料   |
|-------------|-------------|--|
| 鋼材類         | 鋼材類         | H形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼、二次製品、ガードレール、スクラップ等(賃料や損料も対象とすることが可能)      |
| 燃料油         | 燃料油         | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油  |
| その他の主要な工事材料 | コンクリート      | レディーミクストコンクリート(生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品 |
|             | アスファルト類     | アスファルト混合物、アスファルト乳剤、改質アスファルト等                                 |
|             | その他の主要な工事材料 | 上記以外の主要な工事材料が対象  |

#### 2. 工期の要件

請求を行う時点で、残工期が2ヶ月以上あること。(運用マニュアルP3 1-2)

**【算定式】** スライド額 = [変動額] - [請負代金の1/100]

変動後の金額は、実勢価格に基づき算出した額と実際の購入金額とのどちらか低い方とする。

ただし、購入金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、適当と認められる場合にあっては、実際の購入金額が実勢価格に基づき算出した額よりも高い場合でも、実際の購入金額とする。

※実勢価格に基づき算出した額・・・発注者が積算する額(物価資料等の価格)

## 証明書類の準備

実際の購入価格が適当な購入金額を証明するために必要な書類

| 書類の種類           | 役割          |
|-----------------|-------------|
| 納品書             | 搬入時期・数量の特定  |
| 請求書・領収書         | 実際の購入価格の証明  |
| 見積書（購入先を除く2社以上） | 購入価格の妥当性の確認 |

※書類が不十分な場合、実勢価格（県設定単価・物価資料）での算定となり、実際の支出額をカバーできない場合があります。

# 請求から契約までの流れ

## 手続きスケジュール（イメージ）

①**請求**：受注者 → 発注者（工期末2ヶ月前まで）

関連様式：様式1 様式1-1

②**通知**：発注者から協議開始の連絡（7日以内）


関連様式：様式2

③**協議**：必要書類の提出、スライド額の確認

関連様式：様式3 様式3-1.2.3 様式4  
様式5 様式5-1

④**契約**：変更契約の締結（工期末まで）

関連様式：様式6

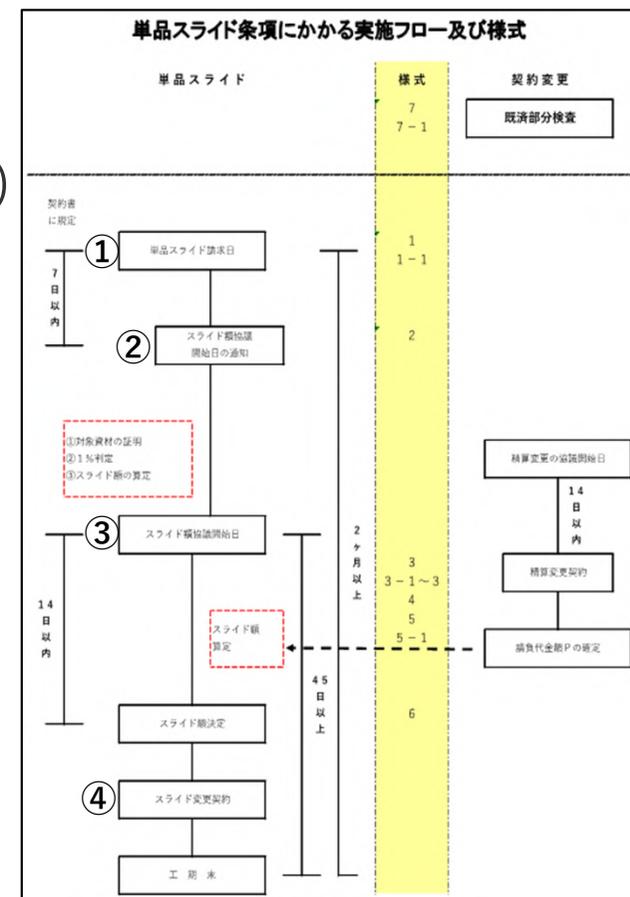


早めに監督員へ意向を伝えることで、後の手続きがスムーズになります。

## 手続きのタイミングと必要書類

### 提出様式とその期限

| 提出期限               | 提出様式                                       | 備考       |
|--------------------|--|----------|
| <b>工期末の2ヶ月前</b> まで | 様式1（請求書）受注者→発注者<br>様式1-1（概算計算書）受注者→発注者     | 残工期2ヶ月必須 |
| 請求から7日以内           | 様式2 発注者→受注者                                |          |
| 協議開始日を目処に          | 様式3（計算書）受注者→発注者<br>様式3-1, 2, 3（証明書）受注者→発注者 | 請求書等を添付  |
| 工期末まで              | 様式6 発注者→受注者                                |          |

# 実施フロー

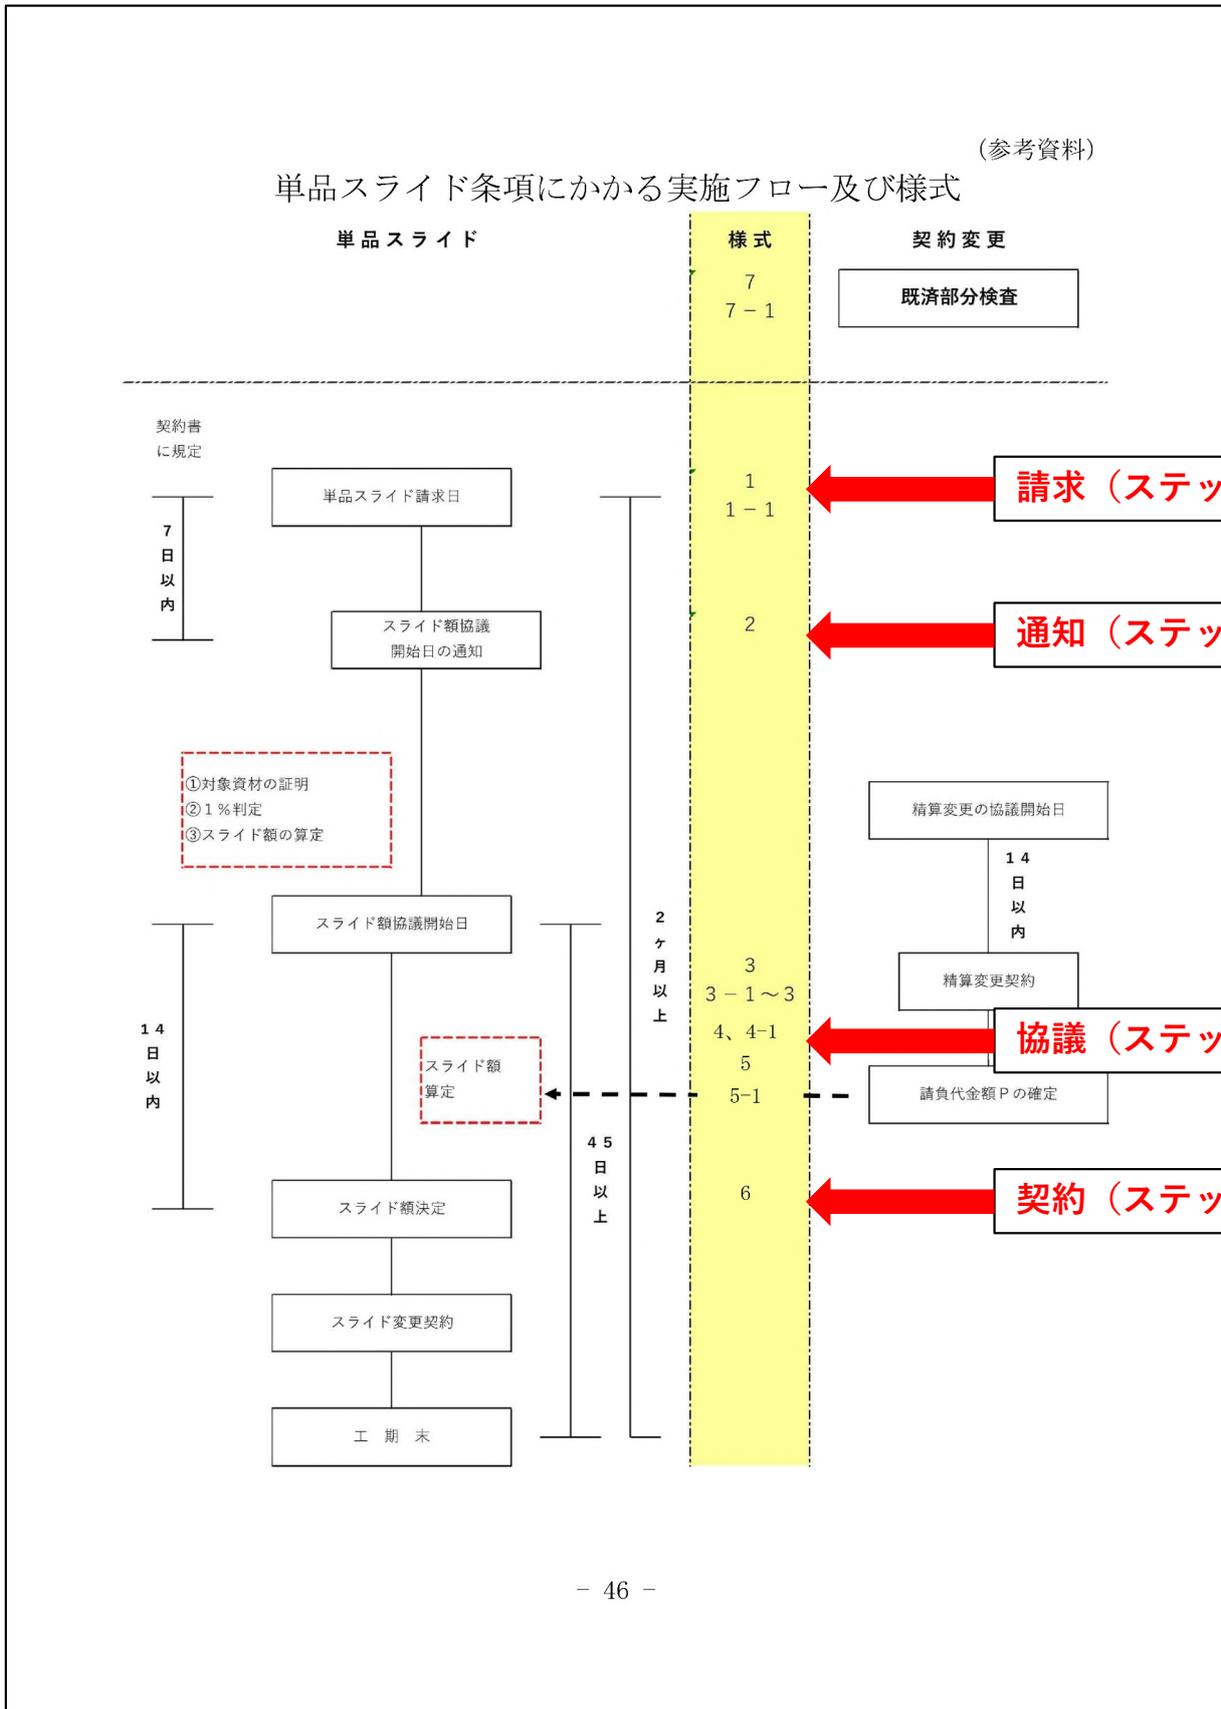

## 【詳細】請求（ステップ1）

### 単品スライド請求日に提出する書類

提出書類：様式1 および 様式1-1

#### 様式1（請負代金額の変更請求について）

：スライド適用の意思表示を行う書類

#### 様式1-1（請負代金額変更請求概算額計算書）

：現時点での変動額が1%を超えていることを「概算」で示す書類

 **運用のポイント**：この段階では「正確な1円単位の数字」よりも

「請負代金額の1%を超えていること」「どの材料が対象か」を明確にすることが優先されます。

**工期末の2ヶ月前までに請求すること。**

# 様式1

(様式1)

令和 年 月 日

(発注者)

殿

(受注者)

商号又は名称

代表者

氏名

住所

〇〇〇〇工事に係る工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求について

標記について、令和〇〇年〇〇月〇〇日付け契約締結した標記工事について、契約当初に比べて工期内に主要な工事材料の価格に変更が生じたので、約款第25条第5項に基づき請負代金額の変更を下記の通り請求します。

記

- 1 工事名 〇〇〇〇工事
- 2 請負代金額 ￥
- 3 請求する主要資材名  
【請求する工事材料を具体的に記載】
- 4 変更請求概算額 ￥

※請求の際には、様式1-1を作成し提出すること。  
なお、今回の請求は、あくまで概算額であり、精査の結果、請求額が変更となっても問題ない。(請求する際は、※の部分は消去すること。)

# 様式1-1

(様式1-1)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

## 請負代金額変更請求概算額計算書

発注者

殿

受注者

商号又は名称

代表者氏名

工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更請求概算額の内訳は、下記のとおりです。

工事名:

記

| 品目        | 規格 | 単位 | 数量    | 当初単価 | 当初想定金額    | 購入単価 | 購入金額      | 購入先  | 購入年月  | 差額        | 備考      |
|-----------|----|----|-------|------|-----------|------|-----------|------|-------|-----------|---------|
| 【記載例】     |    |    |       |      |           |      |           |      |       |           |         |
| ○鋼        | ○  | t  | 1     | 100  | 100       | 200  | 200       | 〇〇商社 | R〇年△月 | 100       |         |
| ○鋼        | ○  | t  |       |      |           |      |           | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
|           |    |    |       |      |           |      |           |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 | R〇年△月 計 |
| ○鋼        | ○  | t  |       |      |           |      |           | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
| ○鋼        | ○  | t  |       |      |           |      |           | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
|           |    |    |       |      |           |      |           |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 | R〇年△月 計 |
| ○鋼 計      | ○  | t  |       |      | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 | ○鋼合計    |
| 鋼材類 合計    |    |    |       |      | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |
| □油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | □□石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
| □油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | □□石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
|           |    |    | 〇.〇〇〇 |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | R〇年△月 計 |
| □油 計      | ○  | L  | 〇.〇〇〇 |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | □油合計    |
| △油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | △△石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
| △油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇  | 〇〇.〇〇〇    | △△石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
|           |    |    | 〇.〇〇〇 |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | R〇年△月 計 |
| △油 計      | ○  | L  | 〇.〇〇〇 |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | △油合計    |
| 燃料油 合計    |    |    |       |      | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |
| 変動額       |    |    |       |      |           |      |           |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |
| 単品スライド請求額 |    |    |       |      |           |      |           |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |

(注)

1. 当様式は、スライド請求時(様式1と同時に提出)及びスライド協議開始時に提出する。
2. 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
3. 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
4. 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。
5. 詳細に数量計算が出来る場合は、様式-3を用いてもよい。

## 【詳細】通知（ステップ2）

### 単品スライド請求日から7日までに通知または受領する書類

受領書類：様式2

様式2（工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議の開始日について）

：スライド額協議開始日を通知する書類

※請求日から**7日以内**に発注者より通知されるため、受注者は受領する  
（スライド額協議開始日の確認）

**スライド額協議開始日は工期末の45日前以上**を確保すること

## 様式2

(様式2)

令和 年 月 日

(受注者)  
商号又は名称  
代表者氏名 殿

(発注者)

〇〇〇〇工事における工事請負契約約款第25条第8項に基づく協議の開始  
の日について(通知)

標記について、令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで請求のあった〇〇〇〇工事における工事  
請負契約約款第25条第8項の規定に基づき、スライド額協議開始日を通知します。

記

1 スライド額協議開始日 令和 年 月 日

※受注者からの請求日から7日以降に工期の延伸を想定している場合は、「工期末の45日  
前」と記載する。(通知する際は、※の部分は消去すること。)

## 【詳細】 協議（ステップ3）

### スライド協議開始日を目処に受注者が提出する書類

提出書類：様式3および様式3-1,2,3

#### 様式3（請負代金額変更請求額計算書）

：精査後の確定したスライド請求額を示す書類

#### 様式3-1（対象材料計算総括表）

：燃料油など、使用時期・数量を細かく整理する書類

#### 様式3-2,3（各種資機材の材料証明書,運賃総括表）

：実際の購入価格や運賃などの内訳を証明する書類

**添付必須**：納品書、請求書、領収書の写しなど、第三者が客観的に金額を確認できる証拠書類を必ず揃えてください。

**スライド額協議開始日からスライド額決定（様式6）までの期間は14日以内**

# 様式3

(様式3)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

## 請負代金額変更請求額計算書

発注者

殿

受注者

商号又は名称

代表者氏名

単品スライド条項に伴う請負代金額の変更請求額の内訳は、下記のとおりです。

工事名:

記

| 品目        | 規格 | 単位 | 数量    | 当初単価   | 当初想定金額    | 購入単価   | 購入金額      | 購入先  | 購入年月  | 差額        | 備考      |
|-----------|----|----|-------|--------|-----------|--------|-----------|------|-------|-----------|---------|
| 【記載例】     |    |    |       |        |           |        |           |      |       |           |         |
| ○鋼        | ○  | t  | 〇〇.〇  | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
| ○鋼        | ○  | t  | 〇〇.〇  | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
|           |    |    | 〇〇〇.〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 | R〇年△月 計 |
| ○鋼        | ○  | t  | 〇〇.〇  | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
| ○鋼        | ○  | t  | 〇〇.〇  | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇.〇〇〇 | 〇〇〇.〇〇〇   | 〇〇商社 | R〇年△月 | 〇〇〇.〇〇〇   |         |
|           |    |    | 〇〇〇.〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 | R〇年△月 計 |
| ○鋼 計      | ○  | t  | 〇〇〇.〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 | ○鋼合計    |
| 鋼材類 合計    |    |    |       |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |
| □油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | □□石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
| □油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | □□石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
|           |    |    | 〇.〇〇〇 |        | 〇〇〇.〇〇〇   |        | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | R〇年△月 計 |
| □油 計      | ○  | L  | 〇.〇〇〇 |        | 〇〇〇.〇〇〇   |        | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | □油合計    |
| △油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | △△石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
| △油        | ○  | L  | 〇〇〇   | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | 〇〇〇    | 〇〇.〇〇〇    | △△石油 | R〇年△月 | 〇〇.〇〇〇    |         |
|           |    |    | 〇.〇〇〇 |        | 〇〇〇.〇〇〇   |        | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | R〇年△月 計 |
| △油 計      | ○  | L  | 〇.〇〇〇 |        | 〇〇〇.〇〇〇   |        | 〇〇〇.〇〇〇   |      |       | 〇〇〇.〇〇〇   | △油合計    |
| 燃料油 合計    |    |    |       |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |        | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |
| 変動額       |    |    |       |        |           |        |           |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |
| 単品スライド請求額 |    |    |       |        |           |        |           |      |       | 〇.〇〇〇.〇〇〇 |         |

(注)

- 当様式は、スライド請求時(様式1と同時に提出)及びスライド協議開始時に提出する。
- 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
- 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、複数枚になってもよい。
- 変動額から受注者の負担額を差し引いて、単品スライド請求額を算出する計算過程を、別紙に記載すること。

# 様式3-1

(様式3-1)

令和〇〇年〇〇月〇〇日

## 請負代金額の変更の対象材料計算総括表

発注者

殿

請負者

商号又は名称  
代表者氏名

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで通知のあった請負代金額の変更に必要な購入した価格等について、下記のとおり資料を提出します。

工事名:

記

| 品目           | 規格    | 単位 | 数量     | 購入単価 | 購入金額      | 購入先  | 購入年月   | 使用した建設機械名 | 使用目的           | 備考   |
|--------------|-------|----|--------|------|-----------|------|--------|-----------|----------------|------|
| 【記載例】        |       |    |        |      |           |      |        |           |                |      |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 5,000  | 90   | 450,000   | 〇〇石油 | R4年4月  |           | 現場内重機          | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 10,000 | 100  | 1,000,000 | 〇〇石油 | R4年5月  |           | 現場内重機          | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 15,000 | 100  | 1,500,000 | 〇〇石油 | R4年6月  |           | 現場内重機          | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 14,000 | 100  | 1,400,000 | 〇〇石油 | R4年7月  |           | 現場内重機          | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 5,000  | 110  | 550,000   | 〇〇石油 | R4年8月  |           | 現場内重機          | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 1,000  | 100  | 100,000   | 〇〇石油 | R4年9月  |           | 現場内重機          | 別添〇〇 |
| 購入数量(証明済み)合計 |       |    | 50,000 |      | 5,000,000 |      |        |           |                |      |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 2,000  |      | 0         | 〇〇石油 | R4年10月 | ダンプ       | 現場～〇〇地先(流用先)運搬 | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 2,000  |      | 0         | 〇〇石油 | R4年11月 | ダンプ       | 現場～〇〇地先(流用先)運搬 | 別添〇〇 |
| 軽油           | 1. 2号 | L  | 1,000  |      | 0         | 〇〇石油 | R4年12月 | ダンプ       | 現場～〇〇地先(流用先)運搬 | 別添〇〇 |
| 購入数量(未証明)合計  |       |    | 5,000  |      |           |      |        |           |                |      |
|              |       |    |        |      |           |      |        |           |                |      |
|              |       |    |        |      |           |      |        |           |                |      |
|              |       |    |        |      |           |      |        |           |                |      |

(注)

- 購入先、購入単価、購入数量等を証明できる場合は、その資料(納品書等)を添付の上、併せて監督職員に提出すること。証明できない場合は、概算数量を記載の上、その算出根拠を記した書類を提出すること。
- 対象材料は、品目毎および購入年月毎にとりまとめるものとする。なお、とりまとめ数量欄が足りない場合は、別紙にとりまとめるものとする。但し、同一の品目で同一年月でも複数の単価がある場合は、区分するものとする。  
また、当該品目が同一月で複数の工種や機械で使用されている場合、監督職員より工種や機械毎等の内訳を提出するよう要求があった場合など、追加資料が必要な場合がある。



# 様式3-3

(様式3-3)

建設機械の貨物自動車等による運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)

【記載例】

| 建設機械名・規格 | 路面切削機      |              |             | 機材搬入所在地 | 〇〇市〇〇 | 現場所在地 | □□市□□ | 機材搬出場所 | 〇〇市〇〇 |      |   |    |    |      |           |
|----------|------------|--------------|-------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|------|---|----|----|------|-----------|
| 機械名      | 運搬車両       |              |             | 運賃      |       |       |       |        |       |      | = | 合計 |    |      |           |
|          | 規格<br>(t積) | 運搬距離<br>(km) | 積載重量<br>(t) | 基本運賃    | ×     | 特大型   | +     | 悪路     | +     | 深夜早朝 |   |    | +  | 冬期割増 | )+        |
| 【記載例】    |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    |      |           |
| セミトレーラー  | 30         | 110          | 29,000      | 81,000  | ×     | 0.70  | +     |        | +     | +    |   |    | )+ |      | = 137,700 |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |      | = 0       |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |      | = 0       |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |      | = 0       |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |      | = 0       |
|          |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    |      |           |
|          |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    |      |           |
|          |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    | 合計   | 137,700   |

重建設機械の分解、組立、および輸送にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)

【記載例】

| 建設機械名・規格 | ブルドーザ21t級  |              |             | 機材搬入所在地 | 〇〇市〇〇 | 現場所在地 | □□市□□ | 機材搬出場所 | 〇〇市〇〇 |      |   |    |    |       |          |
|----------|------------|--------------|-------------|---------|-------|-------|-------|--------|-------|------|---|----|----|-------|----------|
| 機械名      | 運搬車両       |              |             | 運賃      |       |       |       |        |       |      | = | 合計 |    |       |          |
|          | 規格<br>(t積) | 運搬距離<br>(km) | 積載重量<br>(t) | 基本運賃    | ×     | 特大型   | +     | 悪路     | +     | 深夜早朝 |   |    | +  | 冬期割増  | )+       |
| 【記載例】    |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    |       |          |
| セミトレーラー  | 20         | 50           | 19,973      | 42,000  | ×     | 0.70  | +     |        | +     | +    |   |    | )+ | 1,355 | = 72,755 |
| トラック     | 4          | 50           | 1,322       | 18,500  | ×     | 0.60  | +     |        | +     | +    |   |    | )+ | 650   | = 30,250 |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |       | = 0      |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |       | = 0      |
|          |            |              |             |         | ×     |       | +     |        | +     |      |   |    | )+ |       | = 0      |
|          |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    |       |          |
|          |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    | 合計    | 103,005  |
|          |            |              |             |         |       |       |       |        |       |      |   |    |    | 合計往復  | 206,010  |

仮設材(鋼矢板、H形鋼、覆工板等)の運搬にかかる運搬金額計算総括表(提出資料)

【記載例】

| 仮設材     | H形鋼        |              |           | 機材搬入所在地    | 〇〇市〇〇 | 現場所在地 | □□市□□ | 機材搬出場所 | 〇〇市〇〇 |   |   |    |      |    |             |
|---------|------------|--------------|-----------|------------|-------|-------|-------|--------|-------|---|---|----|------|----|-------------|
| 機械名     | 運搬車両       |              |           | 運賃         |       |       |       |        |       |   | = | 合計 |      |    |             |
|         | 規格<br>(t積) | 運搬距離<br>(km) | 台数<br>(t) | 品目         | 数量(t) | ×     | 基本運賃  | ×      | 深夜早朝  | + |   |    | 冬期割増 | )+ | 地区割増<br>その他 |
| 【記載例】   |            |              |           |            |       |       |       |        |       |   |   |    |      |    |             |
| セミトレーラー | 20         | 90           | 5         | H形鋼(12m以内) | 95    | ×     | 4,000 | ×      |       | + |   |    | )+   |    | = 380,000   |
|         |            |              |           |            |       | ×     |       | ×      |       | + |   |    | )+   |    | = 0         |
|         |            |              |           |            |       | ×     |       | ×      |       | + |   |    | )+   |    | = 0         |
|         |            |              |           |            |       | ×     |       | ×      |       | + |   |    | )+   |    | = 0         |
|         |            |              |           |            |       | ×     |       | ×      |       | + |   |    | )+   |    | = 0         |
|         |            |              |           |            |       |       |       |        |       |   |   |    |      |    |             |
|         |            |              |           |            |       |       |       |        |       |   |   |    |      | 合計 | 380,000     |

## 【詳細】 契約（ステップ4）

### 変更契約までに発注者から受注者へ協議を行う書類

協議書類：様式4、様式4-1、様式5、様式5-1および様式6

#### 様式4、4-1（スライド変更等協議書、内訳書）

：対象品目、規格、数量を決めた際に必要に応じて使用する

#### 様式5、5-1（スライド調書、計算書）

：スライド額を算定するための調書および計算書

#### 様式6（工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額の変更について）

：スライド額を確定するために交わす書類

様式5、5-1は受領しなくてもよい発注者側の書類

**受注者は様式6を受領後、異存がなければ変更契約書を提出する（単品スライド成立）  
スライド額協議開始日からスライド額決定（様式6）までの期間は14日以内**

# 様式4

(様式4)

## スライド変更等協議書

令和 年 月 日

(受注者)

商号又は名称

代表者氏名

殿

(発注者)

1 件 名 :

2 工期又は履行機関 : 令和〇〇年〇〇月〇〇日から令和〇〇年〇〇月〇〇日まで

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで請求のあった工事請負契約約款第25条第5項の適用に基づく請負代金額の変更請求について別添(様式-4-1)のとおり品目、規格、数量としたので協議します。

※本様式は、発注者から協議開始日に受注者に対象の品目、規格、数量等について通知する場合に必要な応じて使用。(協議する際は、※の部分は消去すること。)



# 様式5

(様式5)

## スライド調書

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 工事名                      |                            |
| 請負代金額<br>(消費税相当額含む)      |                            |
| 工期                       | 自) 令和 年 月 日<br>至) 令和 年 月 日 |
| スライド金額 (S)               |                            |
| うち取引にかかる消費税及び<br>地方消費税の額 |                            |

(発注者)

# 様式5-1

(様式5-1)

## 〇〇〇〇工事に係る物価の変動に基づくスライド額計算書

|   |  |
|---|--|
| ①請負代金額(スライド額含まず)<br>(消費税額含む)  |  |
| ②設計書金額<br>(消費税相当額含む)  |  |
| ③既済部分出来形金額<br>(消費税相当額含む)  |  |
| ④スライド対象請負金額(①-③)<br>(消費税相当額含む)  |  |
| ⑤(M <sub>鋼(変更)</sub> - M <sub>鋼(当初)</sub> )<br>又は(請負の購入金額・鋼 - M <sub>鋼(当初)</sub> )<br>の安い方<br>(消費税含む・落札率考慮) |  |
| ⑥(M <sub>油(変更)</sub> - M <sub>油(当初)</sub> )<br>又は(請負の購入金額・油 - M <sub>油(当初)</sub> )<br>の安い方<br>(消費税含む・落札率考慮) |  |

1)スライド額(S)

$$S = (M_{\text{鋼(変更)}} - M_{\text{鋼(当初)}}) + (M_{\text{油(変更)}} - M_{\text{油(当初)}}) - P \times 1 / 100$$

$$= ⑤ + ⑥ - ④ \times 1 / 100 = \boxed{\phantom{000000}} \text{円}$$

$$M_{\text{鋼(当初)}}, M_{\text{油(当初)}} = \{p_1 \times D_1 + p_2 \times D_2 + \dots + p_m \times D_m\} \times k \times 105 / 100$$

$$M_{\text{鋼(変更)}}, M_{\text{油(変更)}} = \{p'_1 \times D_1 + p'_2 \times D_2 + \dots + p'_m \times D_m\} \times k \times 105 / 100$$

S : スライド額

M<sub>鋼(当初)</sub>, M<sub>油(当初)</sub> : 価格変動前の鋼材類又は燃料油の金額

M<sub>鋼(変更)</sub>, M<sub>油(変更)</sub> : 価格変動後の鋼材類又は燃料油の金額

p : 設計時点における各対象材料の単価

p' : 3の規定に基づき算定した価格変動後における各対象材料の単価

D : 4の規定に基づき各対象材料について算定した対象数量

k : 落札率

P : スライド対象請負代金額

スライド額(S) =  $\boxed{\phantom{000000}}$  円(千円未満切り捨て)

# 様式6

(様式6)

令和 年 月 日

(受注者)

商号又は名称

代表者氏名 殿

(発注者)

〇〇〇〇工事における工事請負契約約款第25条第5項に基づく請負代金額  
の変更について(協議)

令和〇〇年〇〇月〇〇日付けで請求のあった標記について、工事請負契約約款第25条  
第7項に基づき、下記のとおり協議します。


なお、異存がなければ、工事請負変更契約書を提出してください。

記

1. 工事名 〇〇〇工事
2. スライド変更金額 (増額) ¥  
うち取引に関わる消費税及び地方消費税の額 ¥

【参考】 (運用マニュアルP43 5-1)

< 単品スライド請求のスケジュール (イメージ) >

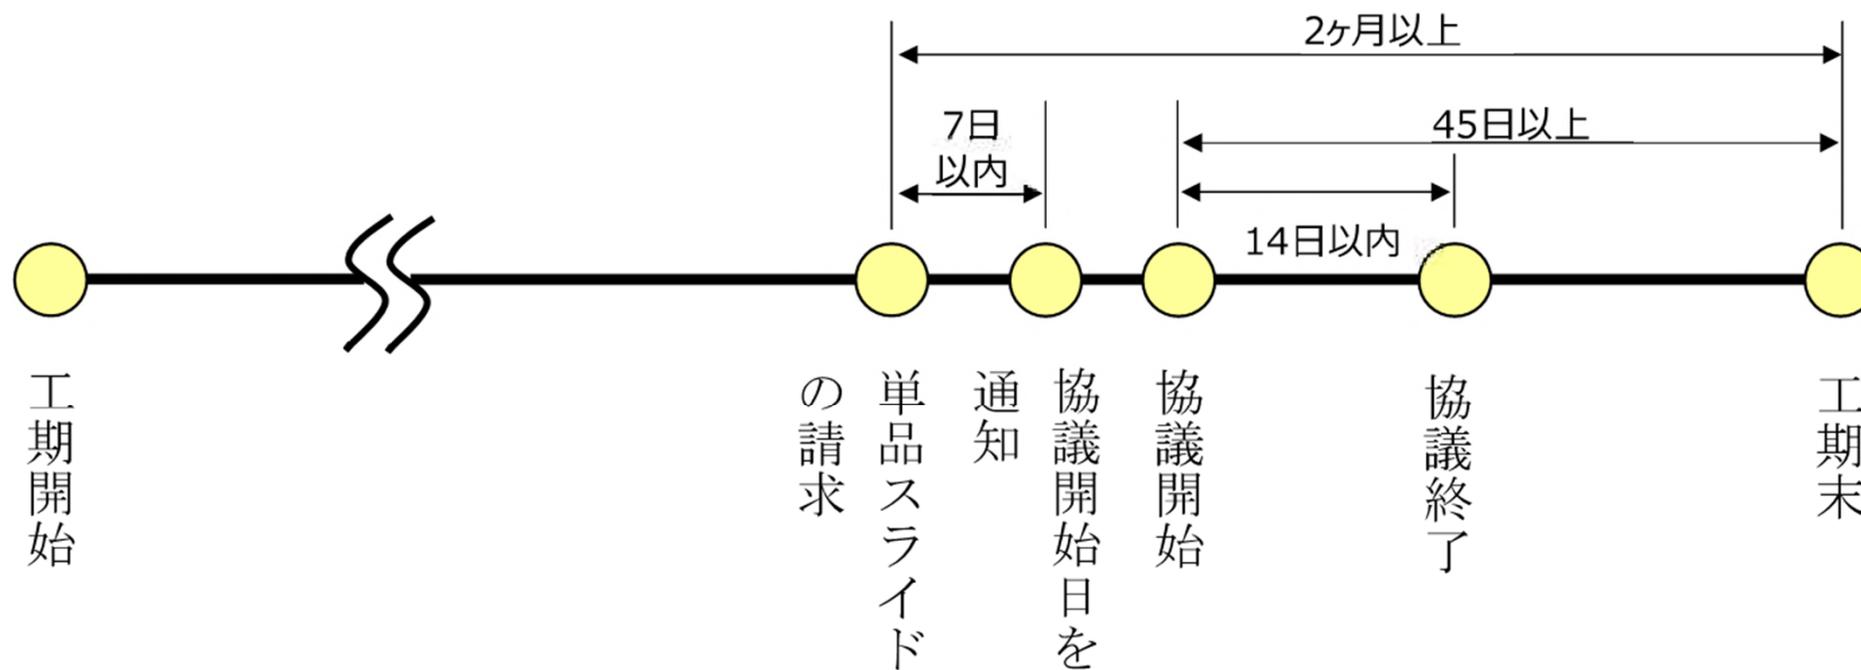

# 【参考】 運用マニュアルP50

## 単品スライド額算定の考え方 概略フロー 別紙-1

### 増額変更の場合の例


(参考) 対象品目及び材料

受注者  
 単品スライドの請求  
 (必要な情報、資料等)  
 ・対象品目、対象材料  
 ・変更請求概算額  
 ・材料毎に対象数量、搬入・購入等の時期  
 購入先、単価・購入価格及び、それが  
 証明できる納品書、請求書、領収書(注)

| 区分          | 品目          | 材料   |
|-------------|-------------|--|
| 鋼材類         | 鋼材類         | 日形鋼、異形棒鋼、厚板、鋼矢板、鉄鋼、二次製品、ガードレール、スクラップ等 (賃料や預料も対象とすることが可能)       |
| 燃料油         | 燃料油         | ガソリン、軽油、混合油、重油、灯油  |
| その他の主要な工事材料 | コンクリート類     | レディーミクストコンクリート (生コン)、セメント、モルタル、コンクリート混和材、コンクリート用骨材、コンクリート二次製品等 |
|             | アスファルト類     | アスファルト混合物、アスファルト乳剤、改質アスファルト等                                   |
|             | その他の主要な工事材料 | 上記以外の主要な工事材料が対象  |

(注)「搬入時期、購入数量、購入先、購入価格」が確認できれば、いづれかで差し支えない。

発注者  
 「実勢価格に基づく変動後の金額」と「実際の購入金額」を比較  
 品目毎の合計金額で比較する (材料毎の比較は行わない)  
 ① 実勢価格に基づく変動後の金額 (品目毎の合計金額) 実勢価格は落札率を考慮  
 ② 実際の購入金額 (品目毎の合計金額)

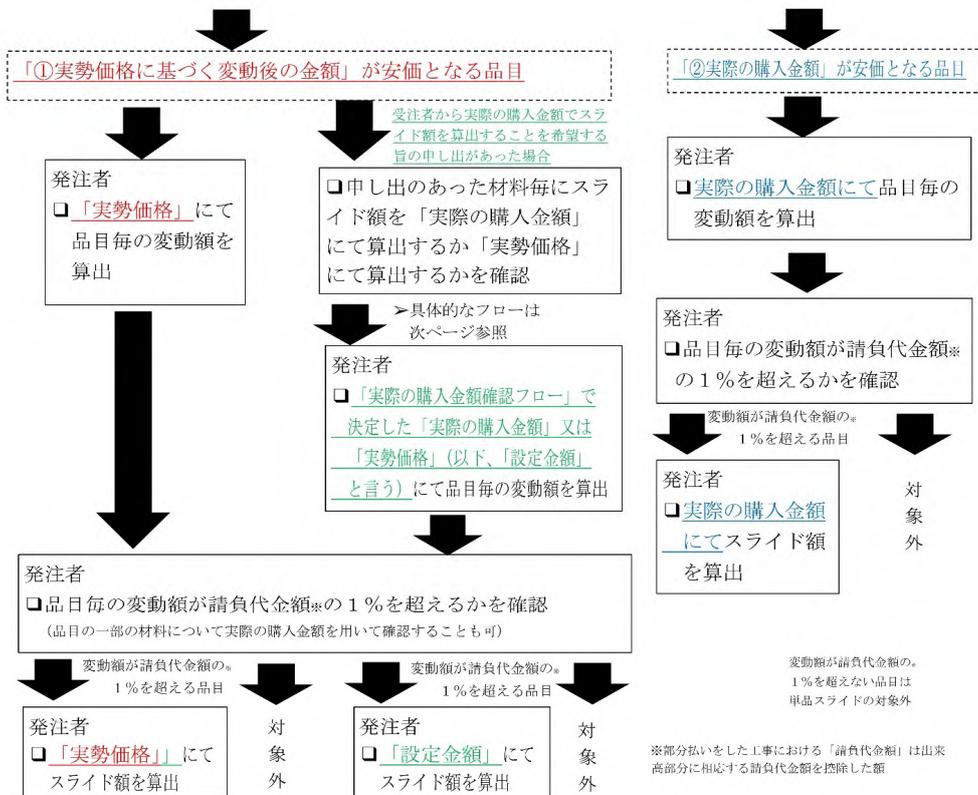

※部分払いをした工事における「請負代金額」は出来高部分に相応する請負代金額を控除した額

